

Unapređenje usluge ispravi.me semantičkom inteligencijom	Verzija: 1.0
Projektna dokumentacija	Datum: 13/11/2025

Unapređenje usluge ispravi.me semantičkom inteligencijom Projektna dokumentacija

Verzija 1.0

Unapređenje usluge ispravi.me semantičkom inteligencijom	Verzija: 1.0
Projektna dokumentacija	Datum: 13/11/2025

Sadržaj

1. Puni naziv projekta	4
2. Skraćeni naziv projekta	4
3. Opis problema teme projekta	4
4. Cilj projekta	4
5. Voditelj studentskog tima	4
6. Rezultat(i)	4
7. Slični projekti	4
8. Resursi	4
9. Glavni rizici	5
10. Smanjivanje rizika	5
11. Glavne faze projekta	5
12. Struktura raspodijeljenog posla (engl. <i>Work Breakdown Structure</i> - WBS)	5
13. Kontrolne točke projekta	5
14. Gantogram	5
15. Zapisnici sastanaka	5

Unapređenje usluge ispravi.me semantičkom inteligencijom	Verzija: 1.0
Projektna dokumentacija	Datum: 13/11/2025

Prijedlog i plan projekta

Na koji način koristiti predložak?

Tekst pisan u italic formi opisuje koje informacije je potrebno uključiti u pojedino poglavlje Prijedloga.

Za upis vlastitog teksta, potrebno je pritisnuti <ENTER> nakon italic teksta.

Tekst upisan u <trokutastim zagradama> treba zamijeniti s onim što se navodi.

Svi članovi tima trebaju pročitati plan i suglasiti se s njime, a to potvrđuju svojim potpisom na kraju dokumenta.

Unapređenje usluge ispravi.me semantičkom inteligencijom	Verzija: 1.0
Projektna dokumentacija	Datum: 13/11/2025

1. Puni naziv projekta

[Navedi puni naziv projekta iz kojeg će biti vidljiva problematika/tematika kojom se projekt bavi.]

Unapređenje usluge ispravi.me semantičkom inteligencijom

2. Skraćeni naziv projekta

[Navedi skraćeni naziv projekta, ako je definiran.]

3. Opis problema/teme projekta

[Objasniti problem, odnosno temu projekta, objasniti ukratko tip, uvjete i kontekst projekta.]

Usluga ispravi.me trenutačno se oslanja na n-gramski sustav za kontekstnu provjeru pravopisa. Iako je taj pristup učinkovit za prepoznavanje lokalnih sintaktičkih pogrešaka, nedostaje mu dublje razumijevanje značenja jezika.

4. Cilj projekta

[Navedi predviđeni cilj ili ciljeve projekta. Definiranje ciljeva omogućuje određivanje pravca u kojem će se kretati izvođenje projekta. Navedi predviđeno trajanje projekta.]

Cilj ovog projekta je integrirati moderne modele vektorskih prikaza riječi (konkretno FastText) kako bi se dodao sloj semantičke inteligencije. To će omogućiti usluzi da prepoznaje kontekstne pogreške, nudi pametnije prijedloge i učinkovitije se nosi sa složenošću hrvatskog jezika.

5. Voditelj studentskog tima

Nikša Brala

6. Rezultat(i)

[Navedi što će se isporučiti na kraju projekta, voditi računa da osim rezultata u vidu nekog proizvoda ovdje treba navesti i svu dokumentaciju.]

Plan rada, tehnička dokumentacija, izvorni kôd i istrenirani FastText model

7. Slični projekti

[Navedi projekte koji su povezani s dotičnim projektom.]

Dosadašnji diplomski i završni radovi iz područja razvoja usluge ispravi.me, kao i sami projekt ispravi.me.

8. Resursi

[Navedi ljudske i ostale resurse potrebne za uspješno dovršenje projekta. Popuniti tablicu raspoloživih članova tima s podacima važnim za projekt. Mogu se navesti znanja i vještine člana koje mogu biti od koristi za projekt, na primjer znanja Java-e, XML-a, iskustvo u radu s MS Projectom, sudjelovanje u sličnim projektima ili bilo kakva korisna informacija. Ako projekt koristi i druge resurse napraviti posebnu tablicu za njih. U kolonu Napomene treba upisati sve termine kad dotični član tima neće biti raspoloživ za rad na projektu (putovanja, odmori, odsustva).]

Unapređenje usluge ispravi.me semantičkom inteligencijom	Verzija: 1.0
Projektna dokumentacija	Datum: 13/11/2025

Tablica ljudskih resursa

Ime i prezime	E-mail adresa	GSM broj	Napomene
Teo Matošević	tm54277@fer.hr	+385 98 917 4415	
Vitomir Brebrić	vitomir.brebric@fer.hr	+385 99 783 2234	
Nikša Brala	nb53922@fer.hr	+385 99 850 0074	

9. Glavni rizici

[Navedi glavne zapreke za ostvarenje uspjeha projekta, te posljedice ukoliko projekt ne uspije.]

- Neraznovrsnost jezika u mrežno dostupnim izvorima (previše formalan, nedostatak žargona i neologizama)
- Jezične pogreške u mrežno dostupnim izvorima (tipfeleri, nenamjerne nepravilne konstrukcije)
- Zaštićenost mrežno dostupnih izvora (copyright)

10. Smanjivanje rizika

[Navedi korake koji će se poduzeti kako bi se što je moguće više umanjio svaki od prethodno navedenih rizika.]

Detaljna provjera (analiza) izvora prije uključivanja u repozitorij (provjera relevantnosti, jezične pravilnosti i zaštićenosti sadržaja)

11. Glavne faze projekta


[Navedi glavne faze projekta, te ukratko objašnjenje po kojem načelu je projekt podijeljen na te faze- vremenska organizacija, smanjenje rizika, raspoloživost resursa i/ili nešto drugo.]

1. Faza: Prikupljanje i nabava korpusa
2. Faza: Čišćenje i predobrada korpusa
3. Faza: Treniranje modela FastText

12. Struktura raspodijeljenog posla (engl. *Work Breakdown Structure - WBS*)

[Nacrtati WBS s navedenim aktivnostima projekta.]

Unapređenje usluge ispravi.me semantičkom inteligencijom	Verzija: 1.0
Projektna dokumentacija	Datum: 13/11/2025

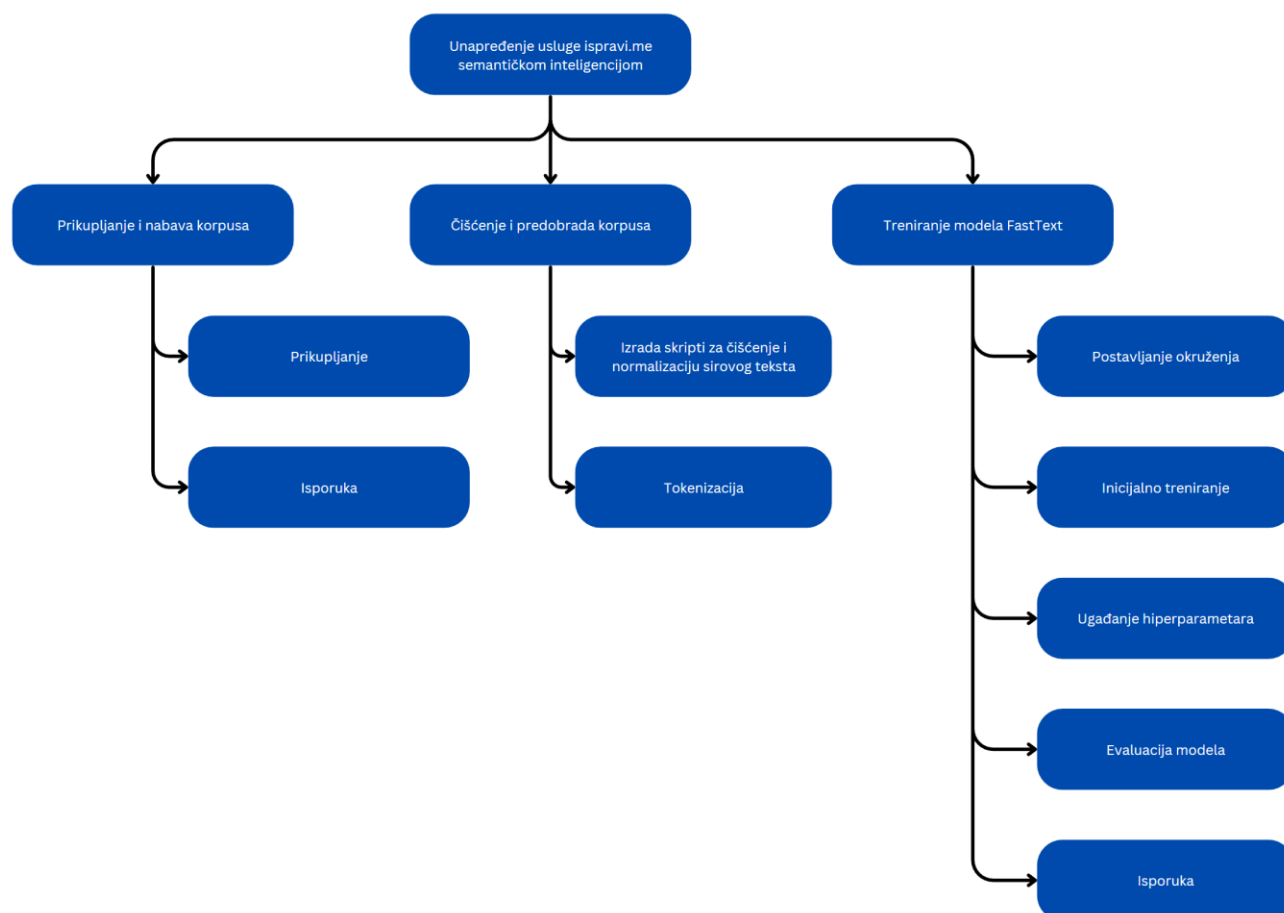

13. Kontrolne točke projekta (engl. *milestones*)

[Općenito, kontrolna točka projekta je događaj ili rezultat neke aktivnosti koji ukazuje na to je li projekt u skladu sa zadanim rokovima ili kasni. Ta informacija se upisuje u kolonu o statusu projekta. Ako projekt kasni moraju se poduzeti akcije da se rokovi dostignu. Za svaku kontrolnu točku treba odrediti točan datum. Po potrebi se mogu dodavati ili oduzimati redovi tablice.]

Tablica kontrolnih točki projekta


Kontrolne točke	Planirani datum	Realizirani datum	Status projekta
Prikupljanje korpusa	28. 11. 2025.		
Isporuka korpusa	5. 12. 2025.		
Izrada skripti za čišćenje i normalizaciju sirovog teksta	15. 12. 2025.		
Tokenizacija	20. 12. 2025.		
Postavljanje okruženja za treniranje FastText modela	23. 12. 2025.		
Inicijalno treniranje	10. 1. 2026.		
Ugađanje hiperparametara	20. 1. 2026.		

Unapređenje usluge ispravi.me semantičkom inteligencijom	Verzija: 1.0
Projektna dokumentacija	Datum: 13/11/2025

Evaluacija modela	25. 1. 2026.		
Isporuka	30. 1. 2026.		

14. Gantogram

[Izraditi Gantogram pomoću programa MS Project, Open Workbench, Microsoft Excel - <http://office.microsoft.com/hr-hr/excel/HA010346051050.aspx>, i sl. Pohraniti prikaz Gantograma (screenshot) i postaviti ga unutar ovog poglavlja kao ubačenu sliku.]

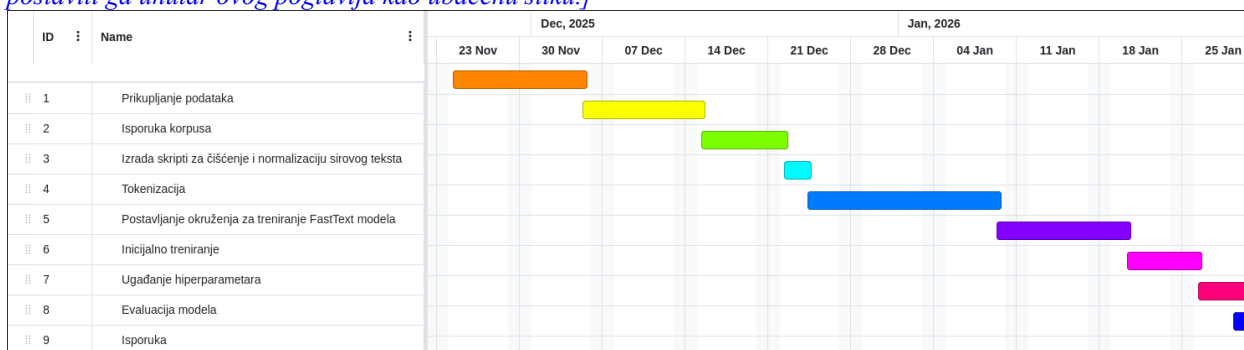

15. Zapisnici sastanaka

[Ovdje za svaki održani sastanak navesti: datum, vrijeme i mjesto održavanja sastanaka, popis nazočnih, glavne zaključke sastanka.]

Sastanak	Datum	Vrijeme	Popis nazočnih	Zaključci
1	13. 11. 2025.	19:00	Teo Matošević, Vitomir Brebrić, Nikša Brala	Završena prva verzija plana projekta
2	28. 11. 2025.	19:00		
3	5. 12. 2025.	19:00		
4	15. 12. 2025.	19:00		
5	20. 12. 2025.	19:00		
6	23. 12. 2025.	19:00		
7	10. 1. 2026.	19:00		
8	20. 1. 2026.	19:00		
9	25. 1. 2026.	19:00		
10	30. 1. 2026.	19:00		

Unapređenje usluge ispravi.me semantičkom inteligencijom	Verzija: 1.0
Projektna dokumentacija	Datum: 13/11/2025

Suglasan s dokumentom (potpisuju članovi tima):

Teo Matošević Datum: _____ Potpis: _____

Vitomir Brebrić Datum: _____ Potpis: _____

Nikša Brala Datum: _____ Potpis: _____

Odobrio(potpisuje nastavnik):

Gordan Gledec

Datum: _____

Potpis: _____
